**Управление информационно-технологическими проектами**

**Практическая работа №4 (занятия 7–8)**

**Тема: Определение расписания проекта**


**Задание:**

Ранее вами была составлена иерархическая структура работ. После определения работ, необходимо оценить трудоемкость работ, определить график их выполнения и общие сроки реализации проекта – составить расписание работ по проекту.


Базовое расписание – утвержденный план-график с указанными временными фазами проекта, контрольными точками и элементами иерархической структуры работ. Базовое расписание может быть наиболее наглядно представлено диаграммой Ганта. В этой диаграмме плановые операции или элементы иерархической структуры работ перечислены с левой стороны, даты отображаются сверху, а длительность операций показана горизонтальными полосками от даты начала до даты завершения.

Воспользуйтесь приложением ganttpro.com (предоставляется бесплатный период работы). GanttPRO – приложение для управления проектами и создания диаграмм Ганта онлайн.


Шаг 1. Введите этапы, работы и вехи проекта (контрольная точка, значимый, ключевой момент, например, при переходе на новую стадию) из ИСР в GanttPRO. При необходимости декомпозируйте еще на 1 уровень, выделите не менее 30 работ.

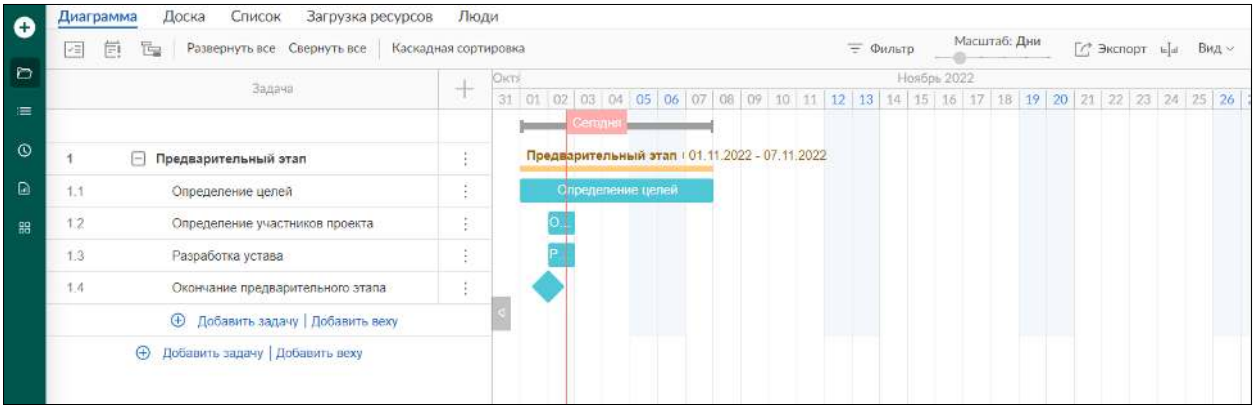



Шаг 2. Определите длительность выполнения работ и связи между ними (финиш-старт, старт-старт, финиш-финиш). Используйте единицу планирования – дни.

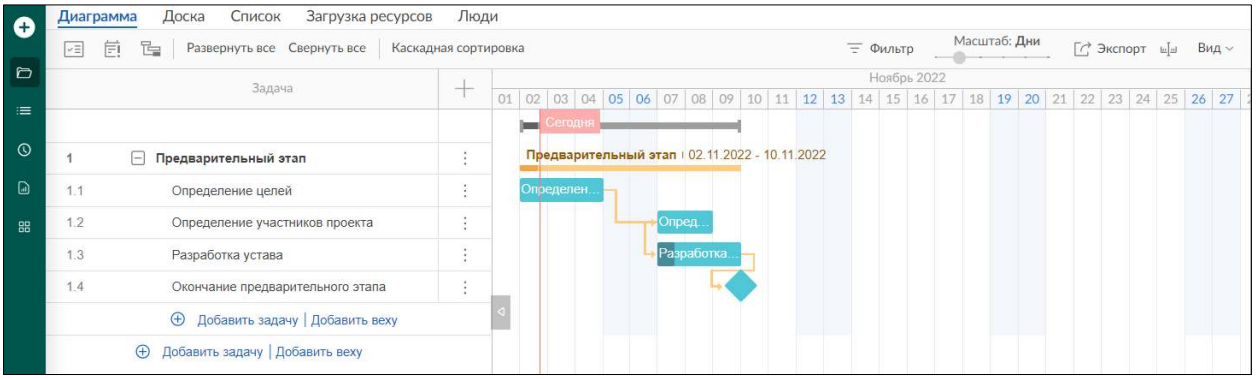


Шаг 3. Выделите человеческие ресурсы, необходимые вам для выполнения проекта. Определите их стоимость.

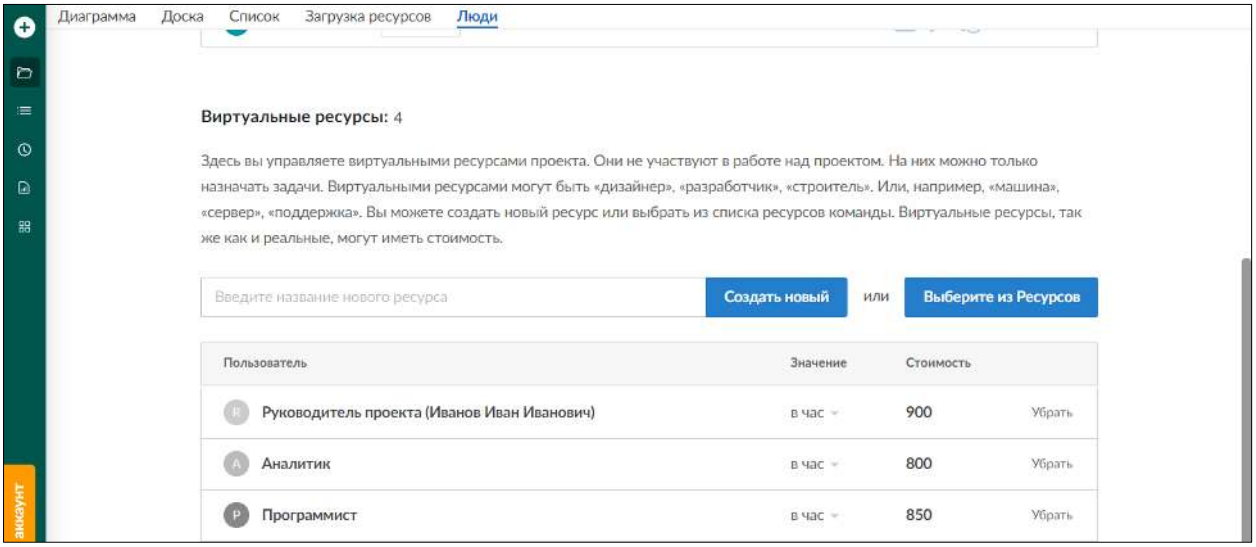



Шаг 4. Распределите ресурсы по работам. Определите время работы сотрудников.

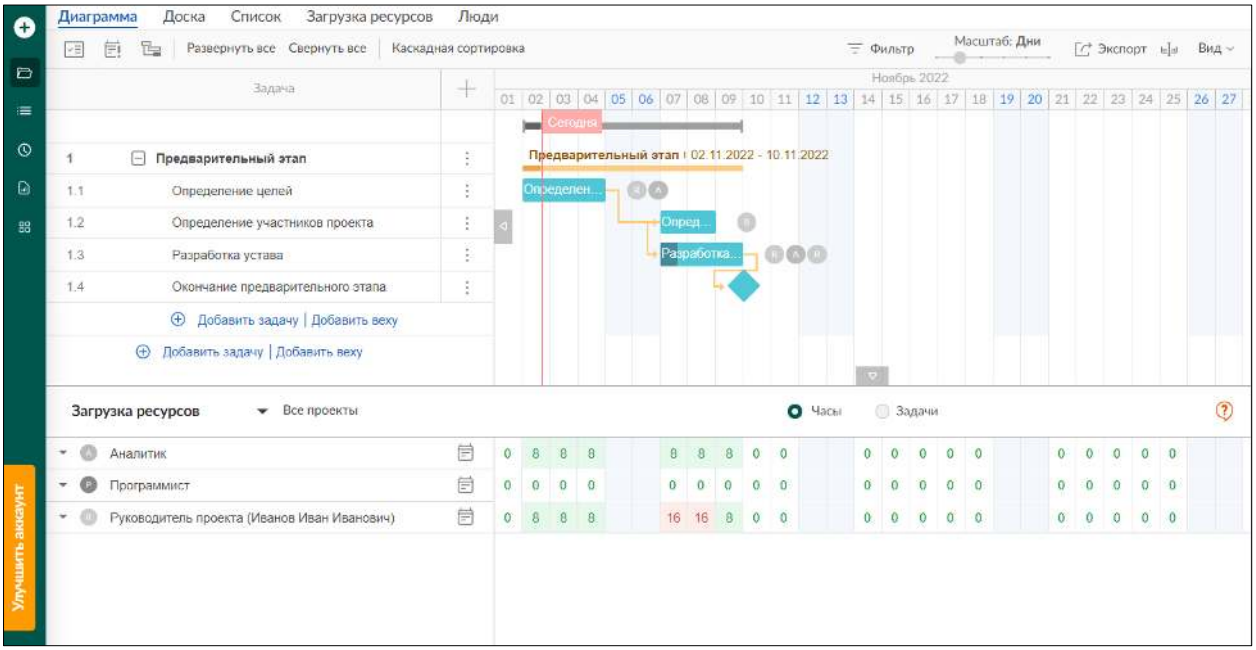


Шаг 5. Проведите корректировку расписания \ ресурсов при наличии перегрузки ресурсов.




Шаг 6. Сделайте экспорт в PDF с демонстрацией критического пути, загрузки ресурсов. Отображайте: исполнителя, начало, завершение, длительность, трудозатраты.

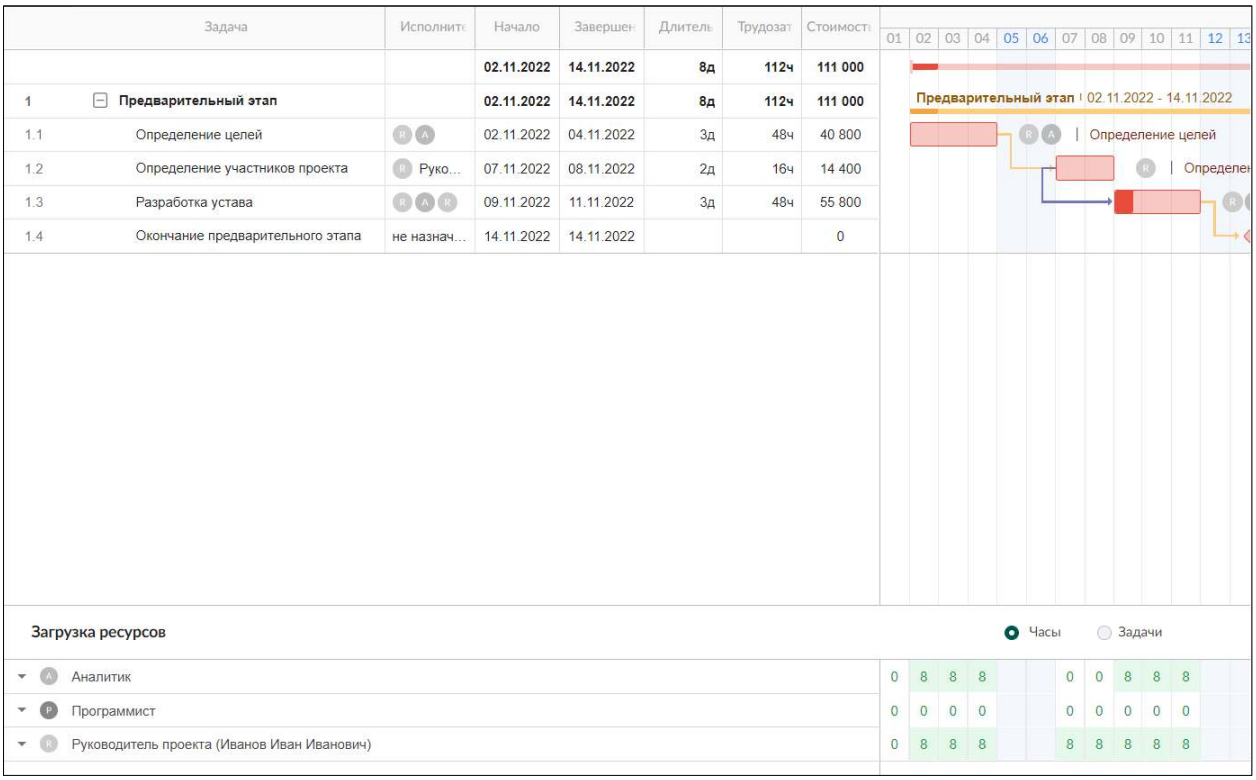


Задание выполняется согласно иерархической структуре работ, подготовленной в предыдущей работе. Результатом практической работы будет pdf из приложения.
